

INFORME SEMANAL DE TAREAS

SEMANA DEL 10 AL 17 DE FEBRERO



DIRECCIÓN DE
OBRAS RURALES



OLAVARRÍA
MUNICIPIO

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.

Se aclara que la mayor parte del cronograma estipulado queda sujeto a variaciones, que pueden ser producto de las condiciones climáticas, rotura o mantenimiento de equipos y/o algún otro factor externo.

Como se viene informando, continua el plan de trabajos que corresponde a alteos de caminos y conformación de cunetas. Con este tipo de tareas se espera que se mejore sustancialmente el escurrimiento del agua, complementando dichas acciones con los dos equipos de reparación y limpieza de alcantarillas que se encuentran en el partido y que también se detallan en el presente informe.


Como dato relevante de esta semana, se puede decir que se está gestionando que, según los milímetros caídos a lo largo de este viernes, se espera que todas las máquinas de la red vial, dentro de la disponibilidad de las empresas, puedan trabajar el fin de semana y aprovechar la humedad para reconformar los entoscados que tengan más próximos. Esta situación queda sujeta tanto a la logística de las empresas como a la condición de humedad que presente cada entoscado, según el milimetraje caído en cada zona.



ZONA 1

- EMPRESA CONTRATISTA: Ancat SA

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

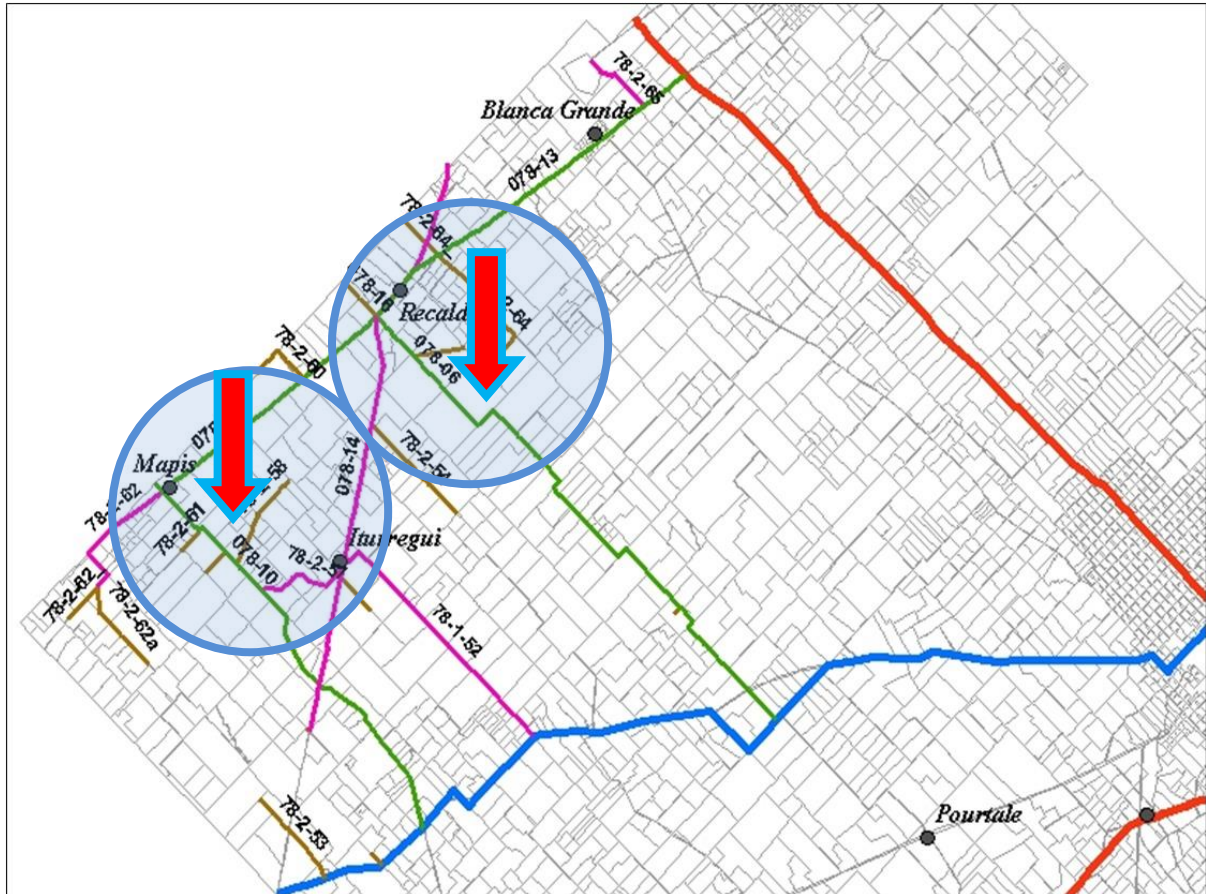

MOTONIVELADORA 1: Actualmente, el equipo se encuentra detenido porque se inició una obra de bacheo en la zona, que abarca un tramo del camino 078- 13 (Acceso a Recalde). Dicha obra se detallará a continuación, y se desarrolla con la misma metodología, el intercambio de horas de equipos según el pliego de mantenimiento. Esto obliga a que se mantenga detenido hasta finalizar la obra, posiblemente la semana próxima.



MOTONIVELADORA 2: Esta semana continuaron las tareas en el camino 78-2-58 (Camino de Modarelli). Allí se está realizando una limpieza de cunetas y alteo de la traza del camino. Si se piensa el camino dividido en tres tramos, se puede observar que el primero de ellos, se alteo y se formaron las cunetas. El segundo tramo de este camino se encontraba alteado desde el año pasado, por lo cual solo se le hizo un reconformado y limpieza de malezas. Y el tercer tramo, y quizás el más crítico, llegando al final, se hará un trabajo de similares características al tramo 1, donde en concordancia con los vecinos de la zona se evaluaron los diferentes puntos críticos y se tratara de altear lo más posible para evitar complicaciones en el invierno.

De producirse las precipitaciones esperadas para este viernes, se intervendrá el camino 078-10, hacia el lado de Mápis.



OBRA BLANCA GRANDE – RECALDE:

La última semana del año pasado se dio inicio a una obra de bacheo sobre la traza del camino 078-13, más precisamente en el tramo Blanca Grande – Recalde (Hasta estancia 15 de octubre). Como se había anunciado, dicha obra se financiará con la metodología de intercambio de horas de equipo, según lo establece el pliego de licitación de mantenimiento vigente.

La idea de esta intervención es poder aportar material en los lugares donde se dificulta la transitabilidad. Si bien entendemos que los días de lluvia y posteriores no se debe circular con ningún tipo de vehículo, según reglamenta la ordenanza municipal 3684/14, ese tramo merecía una intervención ya que es altamente transitado por la comunidad rural en general.


Al principio de esta semana se trasladaron los equipos hacia Olavarría, habiendo finalizado la obra en el tramo estipulado. Ahora solo resta que se produzcan algunas precipitaciones para darle la terminación final. Además, se estima que durante este mes y parte del próximo la motoniveladora 1 de esta zona siga detenida, a fin de poder cumplir con el intercambio horario establecido por el pliego para poder llevar a cabo la obra.



ZONA 2

- EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

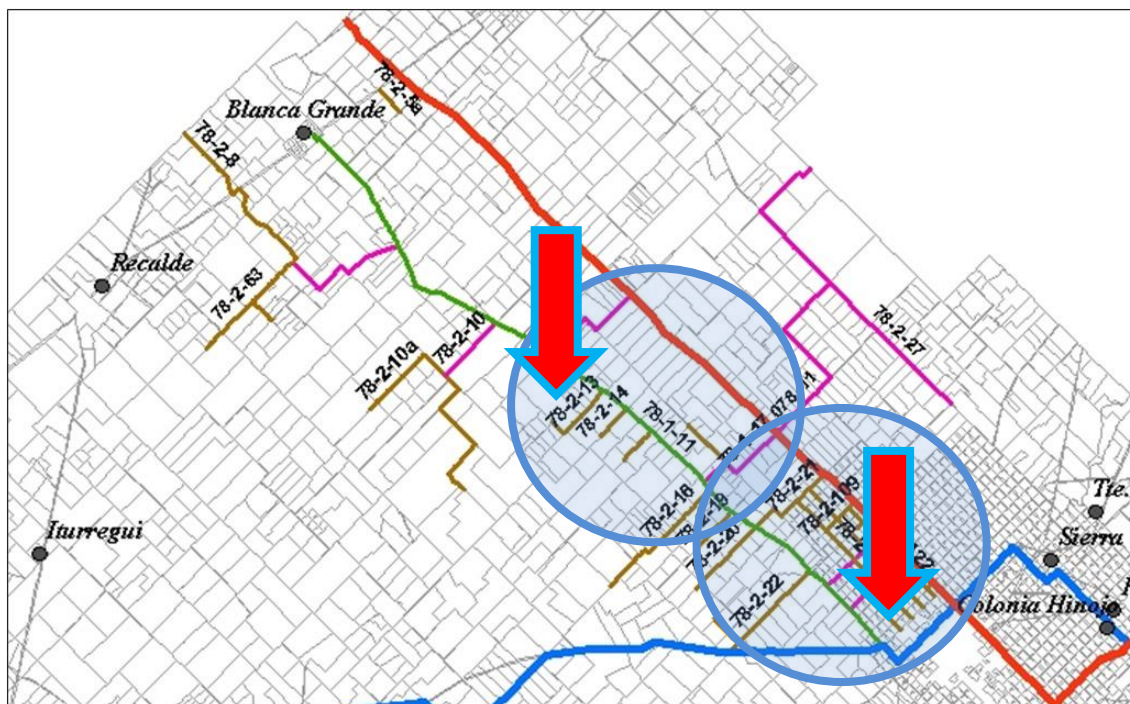


MOTONIVELADORA 1: Este equipo se mantuvo operativo en la misma zona que la semana anterior, es decir, camino 78-2-123 (Prolongación camino a Crotto). Allí se está alteando toda la traza y se están limpiando y conformando las cunetas. Se espera continuar allí hasta que tengamos humedad suficiente como para intervenir el camino 78-1-11 (Ruta 226 vieja) en el tramo de la laguna Blanca Chica.





MOTONIVELADORA 2: Luego de concluir las tareas previstas para la semana pasada, este equipo se trasladó al camino 78-2-16 (Ojo de agua). Allí, según lo acordado con algunos productores de la zona, se comenzó a trabajar en las cunetas para lograr un correcto escurrimiento del agua. Se espera poder intervenir varios tramos del mismo camino con esta metodología. Si se producen las precipitaciones previstas, este equipo se traslada al camino 78-1-11 (Ruta 226 vieja) a realizar el reconfirmado del tramo que abarca desde la bajada del km 319 hacia la laguna Blanca Chica.





ZONA 3

- EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:



MOTONIVELADORA 1: Este equipo concluyó las tareas en la obra de reentoscado del camino 078-13 (Blanca Grande – Recalde). Dicha obra se detalló en este informe y se espera que continúe hasta la semana próxima.

Se limpiaron las cunetas y se reconstituyó la pendiente transversal en ellas en una zona de la obra detallada anteriormente. Las mismas estaban cubiertas de pasto, por lo que se dificultaba el escurrimiento hacia el canal que se encuentra paralelo a la traza del camino principal.

Además, se comenzaron tareas de alteo en el camino 078-06 (La montañesa), con el objetivo de mejorar la traza y darle la mayor altura posible para no tener problemas en el invierno, cuando las precipitaciones en general causan más problemas.



MOTONIVELADORA 2: Como se había anticipado en el informe anterior, este equipo estuvo realizando tareas de reconformado en el camino 78-1-104 (Frontera Sur). Allí la humedad permitió hacer solo un reconformado liviano, quedando a la espera de las lluvias anunciadas para volver a intervenirlo.


Además, continuando con el plan de alteos y reconformados de cunetas previsto para esta parte del año, se logró intervenir el camino 78-2-32 (estación querandíes). Allí solo se está inter viniendo un segmento del camino que es de tierra, quedando también a la espera de las precipitaciones para poder completar el mantenimiento en su totalidad.



ZONA 4

- ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

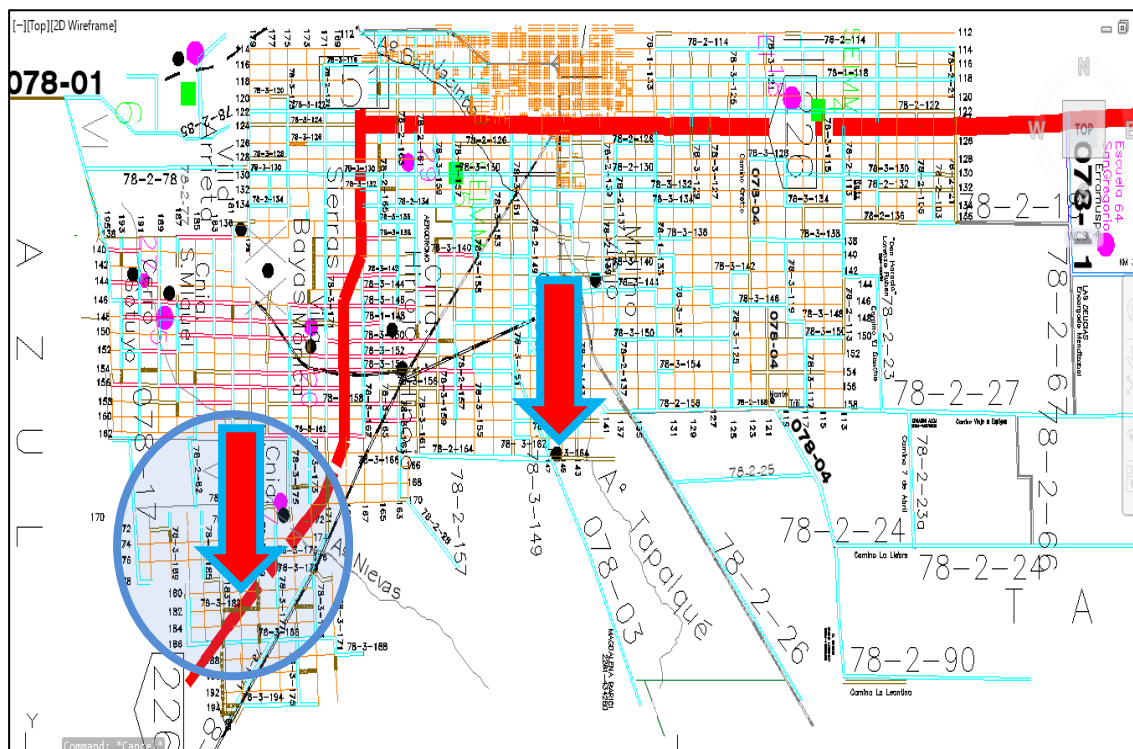

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continúa trabajando en la zona de Colonia Nievas. Allí se está abordando de manera integral una problemática que se repite a lo largo de años. Inicialmente se están alteando algunos caminos del sector, y se le está aportando material tipo estabilizado proveniente de la donación de Canteras Piatti.



RETROEXCAVADORA MUNICIPAL: Este equipo inició tareas de entoscado y formación de cunetas en el camino 78-3-37b (camino a 16 de julio – Zona El Perdido). Se está realizando un importante movimiento de suelo, a fin de garantizar el escurrimiento del agua, y a su vez, la extracción de tosca para mejorar la transitabilidad. Además, se realizaron tareas de desmonte en una zona donde las plantas impedían el escurrimiento del agua.


La zona es altamente transitada, y tuvo varias complicaciones en el primer parte del año donde las precipitaciones fueron abundantes. Se espera poder conectar este tramo de camino con el entoscado perteneciente a Benito Juárez, y lograr mejorar la conectividad de esa zona con la localidad de 16 de Julio. En la medida que la obra avance se irán mostrando imágenes y comunicando en el presente informe.



ZONA 5

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA:

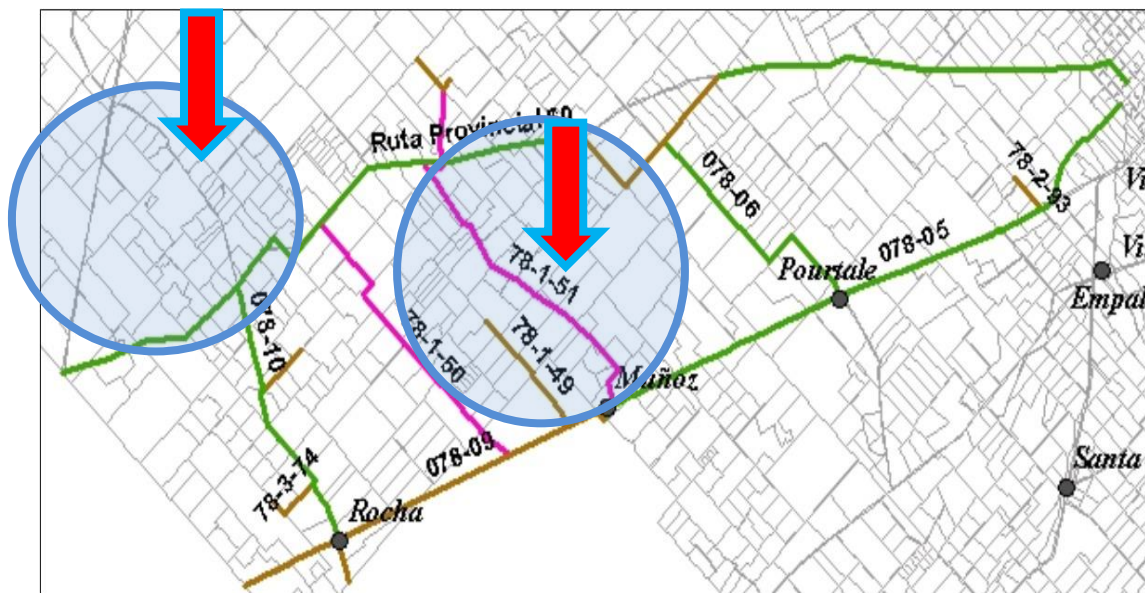


MOTONIVELADORA 1: Este equipo continúa con el camino 78-1-51 (Muñoz – Ruta 60). Allí se están alteando las partes bajas que se vieron afectadas por las precipitaciones del año pasado. Se espera continuar en la zona hasta que se produzcan las precipitaciones, y según los criterios de inspección, ver que entoscados cercanos se pueden reconformar.



ZONA 6

EMPRESA CONTRATISTA: SACCHI VIAL

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS POR ZONA:

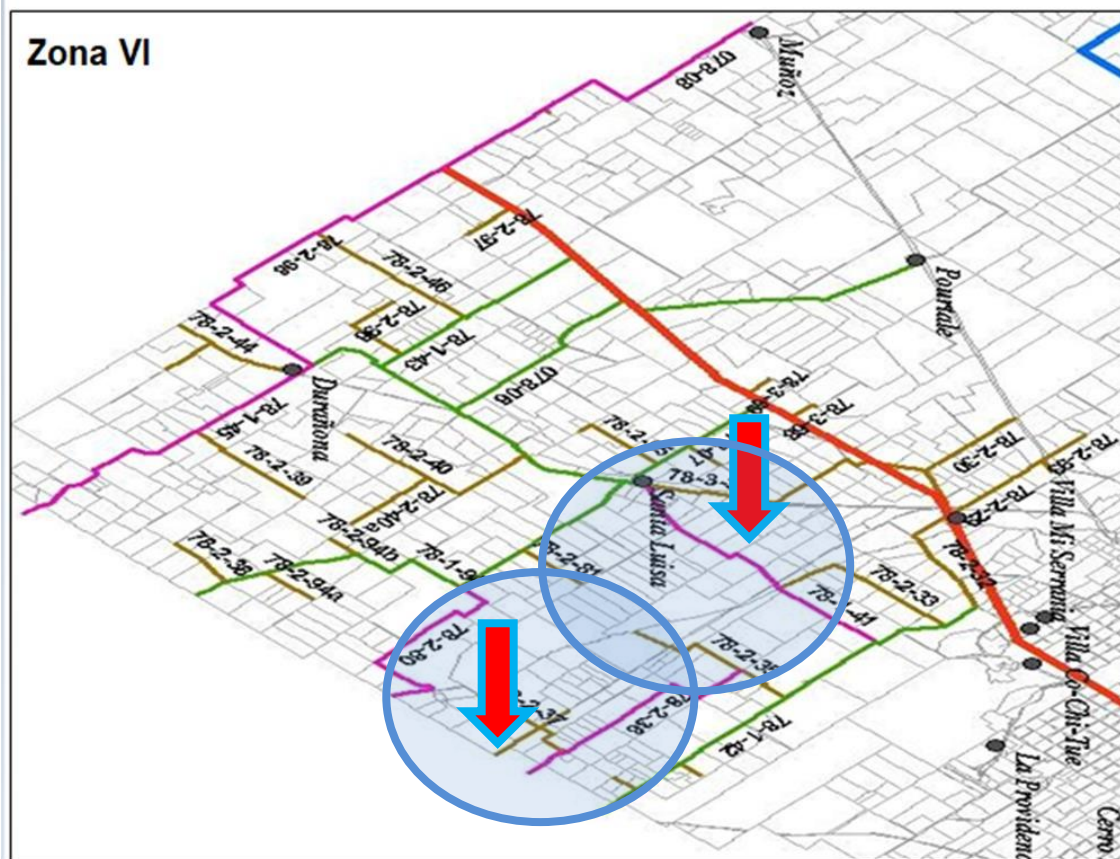

MOTONIVELADORA 1: Este equipo, continuó las tareas iniciadas en el camino 78-1-41 (Santa Luisa – La Mali). Allí se comenzó levantando las partes bajas, afectadas por cortes durante las precipitaciones. Al igual que con el resto de las motoniveladoras, se están interviniendo tramos de tierra, donde se puede altear sin problemas, logrando arrastrar el material desde las cunetas (Inexistentes en partes) hacia la traza del camino. Lógicamente son trabajos que demandan mucho tiempo, por lo cual el avance diario es menor, pero entendemos que es beneficioso sobre todo en los periodos cuando las precipitaciones son abundantes.



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12



MOTONIVELADORA 2: Este equipo continúa trabajando en la zona cercana a 16 de Julio, en el límite con el partido de Benito Juárez. Allí se logró desparramar parte del material aportado por la retroexcavadora municipal, y se comenzó con el alteo de las partes de tierra que prontamente se les aportará material para mejorar la transitabilidad. Además, se espera poder intervenir con las precipitaciones anunciadas los caminos cercanos como el 78-1-42 (Loma Alta), el 78-17 (Salida hacia enlace N. Kirchner) y demás transversales. De ser necesario se evaluará el traslado al lugar de la otra motoniveladora de la zona con el objetivo de aprovechar la humedad que pueda llegar a existir luego de las lluvias.



MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS: Continúan a buen ritmo las tareas de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el partido en dos grandes zonas, las cuales están a cargo de la empresa LECON SA.

Uno de los equipos continúa en la zona Recalde – Blanca Grande, con el objetivo de aprovechar este tiempo sin precipitaciones y tratar de limpiar todas las alcantarillas del tramo del camino principal. Una vez llegado a Recalde (Semana próxima) se comenzará con el cambio de tubos rotos de la zona.

El otro de los equipos se encuentra pasando estación Muñoz, precisamente en el camino 78-2-50 (Camino de Torres). Se espera que cuando concluya sus tareas de limpieza allí, se llegue a estación Rocha, donde hay varios tubos que reponer.





TAREAS ADICIONALES: El día Jueves 13/02, se comenzó con la limpieza de un canal lindero a la zona de Cochi – Tue. Estas tareas estuvieron coordinadas con los vecinos del lugar, luego de realizarle un alteo y entoscado del camino que pasa por el frente de la comunidad. De esta manera, se podrá garantizar el correcto escurrimiento del agua y así se evitará que, en los periodos de muchas precipitaciones, el canal desborde y traspase el camino, dejándolo intransitable.

Esta tarea se está realizando en conjunto con la delegación de Loma Negra, uniendo los recursos de ambas partes para que el trabajo sea posible.

Entre otras cosas en colaboración con parte del equipo de la planta urbana, se logró restituir cartelería en distintos puntos de la red, que era inexistente o en algunos casos se encontraba mal posicionada, propensa a sufrir algún hecho de vandalismo, generando inseguridad al tránsito.





De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 9 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, un compactador autopropulsado, 2 retropala y 4 camiones tipo tatú.

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, dependiendo de su estado.

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos en contacto para abordar la problemática.

Saluda atte.

ING. Mariano Arrignon

DIRECTOR DE OBRAS RURALES

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

OLAVARRIA, 14 de febrero de 2025.
